Projektablaufplan 2020

Letzte Änderung: 24.01.2020

Zurück zur Hauptseite

Heutiges Datum: 28.01.2020

Aktuelle Kalenderwoche: 5

Zu berücksichtigen sind außerdem alltäglich sowie unerwartet anfallende Aufgaben oder kleinere Projekte, die von der Schul-IT nebenbei erledigt werden müssen!

Nicht erfasster Bereich
Schul-IT nicht im Dienst

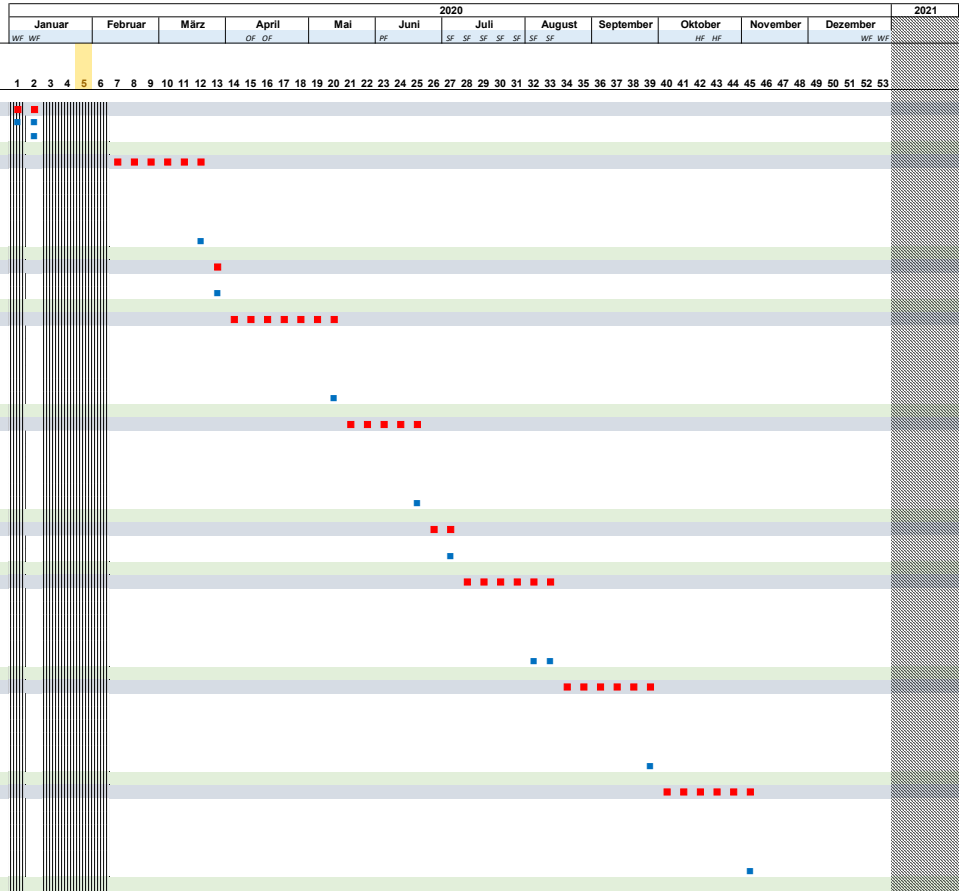

Arbeitspaket	Beteiligung	Status	Start-Termin	End-Termin	Start KW	Ende KW
Glasfaser und WLAN am Oswald-von-NBBK Coesfeld (siehe 2019)		**Offen**	**02.01.2020**	**10.01.2020**	**1**	**2**
Anschluss und Konfiguration der Access Points - Teil 2 (Vervollständigung)	Schul-IT, IT-Azubis	Offen	02.01.2020	10.01.2020	1	2
Testphase und Puffer zur Behebung möglicher Probleme	Schul-IT	Offen	06.01.2020	10.01.2020	2	2
WLAN am Pictorius Berufskolleg Coesfeld		**Offen**	**10.02.2020**	**20.03.2020**	**7**	**12**
IST-Aufnahme zur Bestimmung der nötigen Komponenten	Schul-IT	Offen	10.02.2020		7	0
Beschaffung und Lieferung der benötigten Komponenten	Schul-IT, Lieferant	Offen			0	0
Vorkonfiguration der Komponenten	Schul-IT	Offen			0	0
Anpassung der IT-Grundstruktur (Installation der Switche etc.)	Schul-IT	Offen			0	0
Anschluss und Konfiguration der Access Points	Schul-IT, evtl. Monteur	Offen			0	0
Testphase und Puffer zur Behebung möglicher Probleme	Schul-IT	Offen	16.03.2020	20.03.2020	12	12
Vervollständigen der WLAN-Austattung Medienzentrum Dülmen		**Offen**	**23.03.2020**	**27.03.2020**	**13**	**13**
Beschaffung und Lieferung zusätzlicher Komponenten (Switch, Access Points)	Schul-IT, Lieferant	Offen	23.03.2020		13	0
Anschluss und Konfiguration der zusätzlichen Geräte	Schul-IT, evtl. Monteur	Offen	23.03.2020	27.03.2020	13	13
WLAN am RVW-Berufskolleg Lüdinghausen		**Offen**	**30.03.2020**	**15.05.2020**	**14**	**20**
IST-Aufnahme zur Bestimmung der nötigen Komponenten	Schul-IT	Offen	30.03.2020		14	0
Beschaffung und Lieferung der benötigten Komponenten	Schul-IT, Lieferant	Offen			0	0
Vorkonfiguration der Komponenten	Schul-IT	Offen			0	0
Anpassung der IT-Grundstruktur (Installation der Switche etc.)	Schul-IT	Offen			0	0
Anschluss und Konfiguration der Access Points	Schul-IT, evtl. Monteur	Offen			0	0
Testphase und Puffer zur Behebung möglicher Probleme	Schul-IT	Offen	11.05.2020	15.05.2020	20	20
WLAN am RVW-Berufskolleg Dülmen		**Offen**	**18.05.2020**	**19.06.2020**	**21**	**25**
IST-Aufnahme zur Bestimmung der nötigen Komponenten	Schul-IT	Offen	18.05.2020		21	0
Beschaffung und Lieferung der benötigten Komponenten	Schul-IT, Lieferant	Offen			0	0
Vorkonfiguration der Komponenten	Schul-IT	Offen			0	0
Anpassung der IT-Grundstruktur (Installation der Switche etc.)	Schul-IT	Offen			0	0
Anschluss und Konfiguration der Access Points	Schul-IT, evtl. Monteur	Offen			0	0
Testphase und Puffer zur Behebung möglicher Probleme	Schul-IT	Offen	15.06.2020	19.06.2020	25	25
Vervollständigen der WLAN-Austattung an der Pestalozzischule Coesfeld		**Offen**	**22.06.2020**	**03.07.2020**	**26**	**27**
Beschaffung und Lieferung zusätzlicher Komponenten (Switch, Access Points)	Schul-IT, Lieferant	Offen	22.06.2020		26	0
Anschluss und Konfiguration der zusätzlichen Geräte	Schul-IT, evtl. Monteur	Offen	29.06.2020	03.07.2020	27	27
Mögliche Softwareumstellung auf KNE School@min am Oswald-von-NBBK		**Offen**	**06.07.2020**	**11.08.2020**	**28**	**33**
	Schul-IT, KNE, Cosoft	Offen	06.07.2020		28	0
		Offen			0	0
		Offen			0	0
		Offen			0	0
		Offen			0	0
Testphase und Puffer zur Behebung möglicher Probleme		Offen	03.08.2020	11.08.2020	32	33
WLAN an der Peter-Pan-Schule Dülmen		**Offen**	**17.08.2020**	**25.09.2020**	**34**	**39**
IST-Aufnahme zur Bestimmung der nötigen Komponenten	Schul-IT	Offen	17.08.2020		34	0
Beschaffung und Lieferung der benötigten Komponenten	Schul-IT, Lieferant	Offen			0	0
Vorkonfiguration der Komponenten	Schul-IT	Offen			0	0
Anpassung der IT-Grundstruktur (Installation der Switche etc.)	Schul-IT	Offen			0	0
Anschluss und Konfiguration der Access Points	Schul-IT, evtl. Monteur	Offen			0	0
Testphase und Puffer zur Behebung möglicher Probleme	Schul-IT	Offen	21.09.2020	25.09.2020	39	39
WLAN an der Pestalozzischule Dülmen		**Offen**	**28.09.2020**	**06.11.2020**	**40**	**45**
IST-Aufnahme zur Bestimmung der nötigen Komponenten	Schul-IT	Offen	28.09.2020		40	0
Beschaffung und Lieferung der benötigten Komponenten	Schul-IT, Lieferant	Offen			0	0
Vorkonfiguration der Komponenten	Schul-IT	Offen			0	0
Anpassung der IT-Grundstruktur (Installation der Switche etc.)	Schul-IT	Offen			0	0
Anschluss und Konfiguration der Access Points	Schul-IT, evtl. Monteur	Offen			0	0
Testphase und Puffer zur Behebung möglicher Probleme	Schul-IT	Offen	02.11.2020	06.11.2020	45	45
